



Lyon 7

# Requalification de la Place des Pavillons et de la rue Marcel Mérieux

Réunion d'information commerçants / 29 mars 2021

IN MÉTROPOLE  
**GRANDLYON**

# Ordre du jour

---

**1 - Rappel du phasage communiqué le 14/12/2020**

**2 - Présentation du phasage actualisé des travaux**

**3 - Rappels des modalités d'échanges, des horaires de chantier, du dispositif d'information**

**4 - Echanges**

**En annexe : le plan des aménagements**

**Fin de la réunion vers 19h30**

# 1 - Rappel du phasage communiqué le 14/12/2020


---

- Livraison du trottoir Est pour le 4/06/2021
- Travaux sur le trottoir Ouest et la Place des Pavillons à partir du 7/06/2021 et jusqu'au 25/02/2022
- Des interrogations restées en suspens:
  - Quelle optimisation des travaux pour limiter l'impact sur les terrasses de la place des Pavillons?
  - Quelle solution pour maintenir un accès aux commerces sur la rue Monod pendant la fermeture du carrefour Monod/Mérieux ?
  - Quelle solution pour maintenir un accès au parking du Vercors lors de la fermeture du carrefour Vercors/Mérieux ?

## 2 - Présentation du phasage prévisionnel actualisé des travaux (hors intempéries)


---

### Légende:

-  : Zone de travaux
-  : Cheminements piétons
-  : Zone de circulation général
-  : Accès parking Place des Pavillons
-  : Zone travaux finis
-  : Sens de circulation général
-  : entrée charretière


## Phase 3a du 12/04/2021 au 07/05/2021: finalisation trottoir Est et démarrage de la partie nord de la Place des Pavillons

- Travaux à réaliser :
  - Trottoir Est: coulage du revêtement béton sur la chaussée, séchage et sablage, traitement des pieds de façade sur les trottoirs et finition en emprises ponctuelles (pose mobilier, candélabres, câblage de réseaux, espaces verts...)
  - Place des Pavillons Nord: démolition, réalisation des fosses infiltrantes, pose des réseaux secs, bordures et revêtements
- Circulation: rappel jusqu'au 7/05: rue Marcel Mérieux en sens unique depuis la rue du Vercors jusqu'à l'avenue Debourg et fermeture du carrefour Challemel-Lacour/ Marcel Mérieux
- Stationnement: Place des Pavillons: suppression de 30 stationnements au nord de la place. Maintien des stationnements au sud de la Place avec entrée/sortie depuis la rue Mérieux (attention au gabarit sous le porche en direction de la rue du Vercors) et maintien de l'accès transport de fonds.
- Terrasses: libération des emprises (terrasses et mobiliers) demandée au 09/04 au lieu du 1/06 : LE METROPOLE; BOULANGERIE MIMOUNI, APSARA, LA CANTINA
- Collecte des déchets ménagers: les riverains trottoir Est déposent et regroupent leurs bacs en limite de chaussée au niveau des perméabilités piétonnes

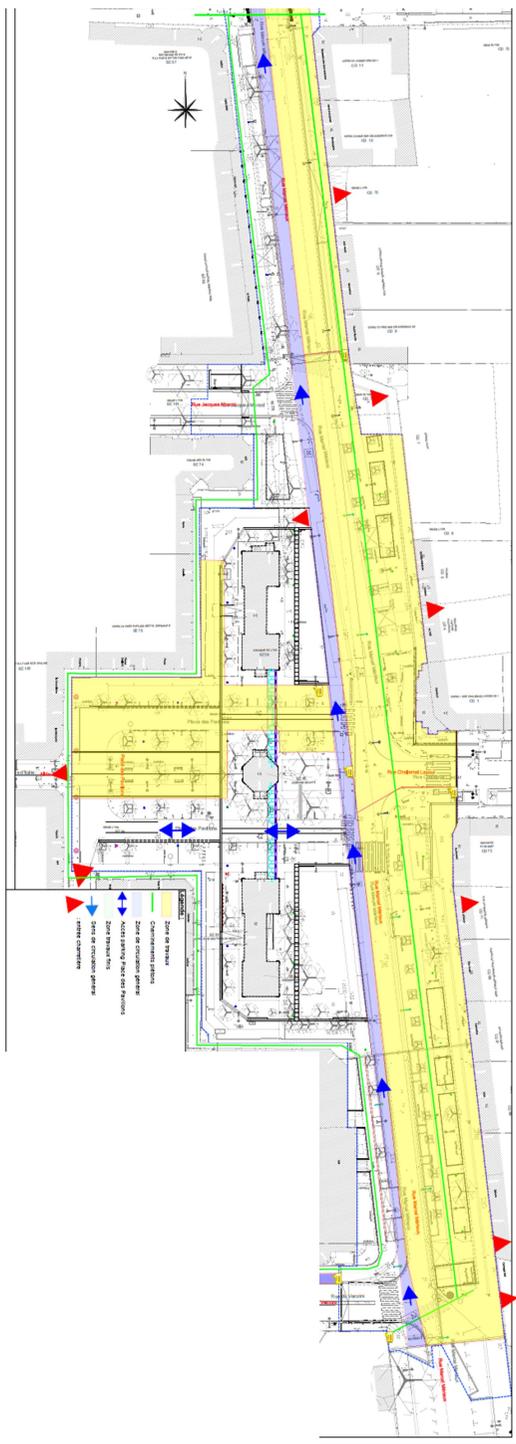




## Phase 3c du 14/06/2021 au 6/08/2021: livraison Place des Pavillons Nord et poursuite du reste du trottoir Ouest

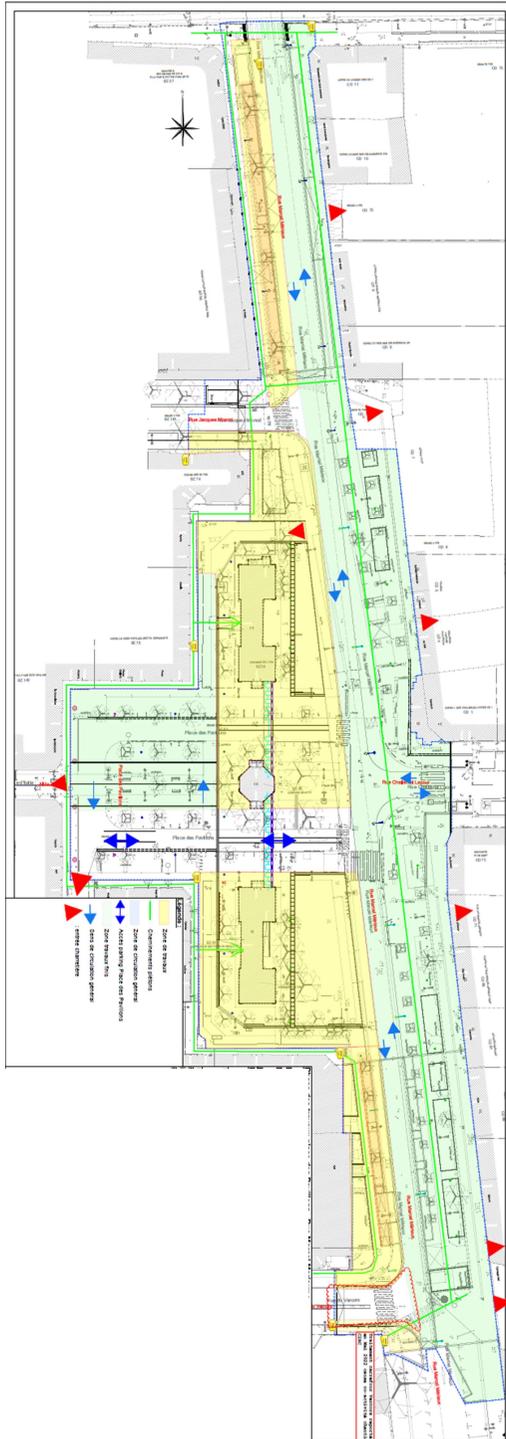

- Travaux à réaliser :
  - Trottoir Est: finition en emprises ponctuelles (pose mobilier, candélabres, câblage de réseaux, espaces verts...)
  - Trottoir Ouest :
    - Restitution de la partie nord de la Place (hors emprises ponctuelles)
    - Pour le reste, poursuite démolition, réseaux secs et assainissement, pose de bordures, réglage des trottoirs et mise à la côte, revêtement bétons
- Terrasses: les établissements LE METROPOLE; BOULANGERIE MIMOUNI, APSARA, LA CANTINA sollicitent la DECA (règlement général des terrasses) pour exploiter à partir du 14/06 une terrasse provisoire et amovible (travaux de finition).

## Phase 3d du 9/08/2021 au 29/10/2021: livraison trottoir Ouest, traitement du carrefour Mérieux/Monod, poursuite de la Place des Pavillons Sud

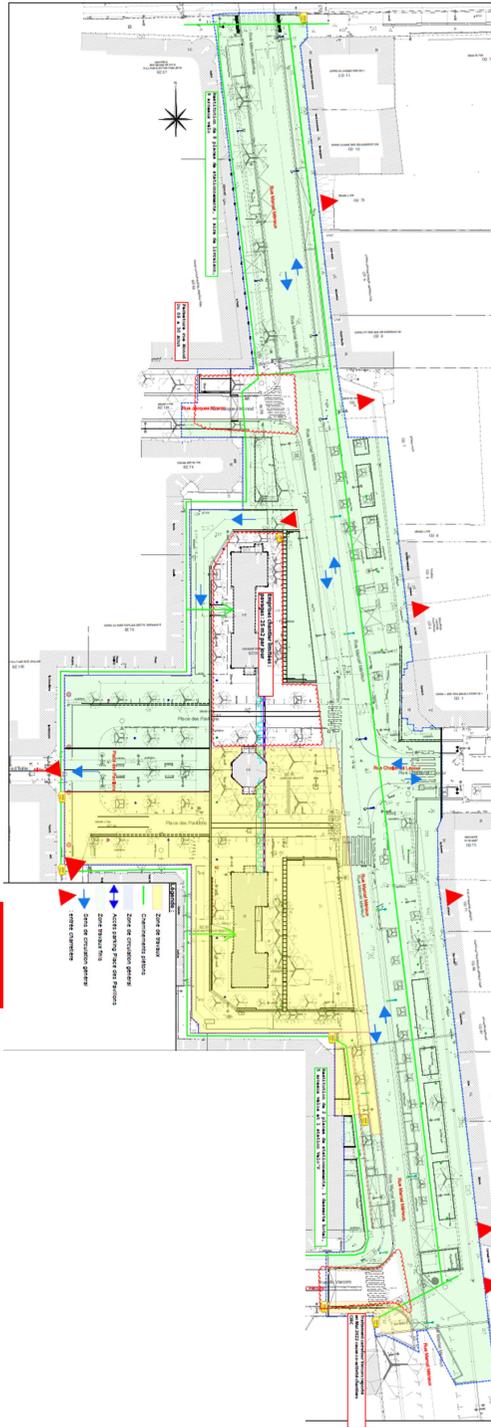

- Travaux à réaliser :
  - Trottoir Est: finition en emprises ponctuelles (pose mobilier, candélabres, câblage de réseaux, espaces verts/plantations...)
  - Trottoir Ouest: restitution hors emprises ponctuelles et planning de pose et mise en service de la station Velo'v à affiner.
  - Pour le reste, poursuite démolition, réseaux secs et assainissement, pose de bordures, réglage des trottoirs et mise à la côte, revêtement bétons sablés et pavés (démarrage du pavage : emprise chantier limitée à 25m<sup>2</sup>/jour)
- Circulation: fermeture rue Monod du 9 au 30/08
- Stationnement: Restitution sur le trottoir Ouest de 10 places de stationnement, 1 aires transport de fonds, 1 desserte hôtel, 14 arceaux vélos
- Terrasses: libération des emprises (terrasses et mobiliers) du KIOSQUE ISTANBUL: déplacement de la terrasse sur la partie nord.

## Zoom plan de déviation : fermeture carrefour Mérieux/Monod

### Fermeture de la rue Monod


Mise en place d'une aire de retournement.  
Signalisation préalable au carrefour avec l'avenue Debourg pour limiter le nombre de personnes qui "coupe" par la rue Monod pour éviter le feu de la rue Marcel Mérieux.

Rue majoritairement VL.  
Demi-tour simple.


### Légende :

- > Circulation générale
- Itinéraire de déviation
- Emprises travaux

Itinéraire de déviation balisé à l'aide de panneaux déviations

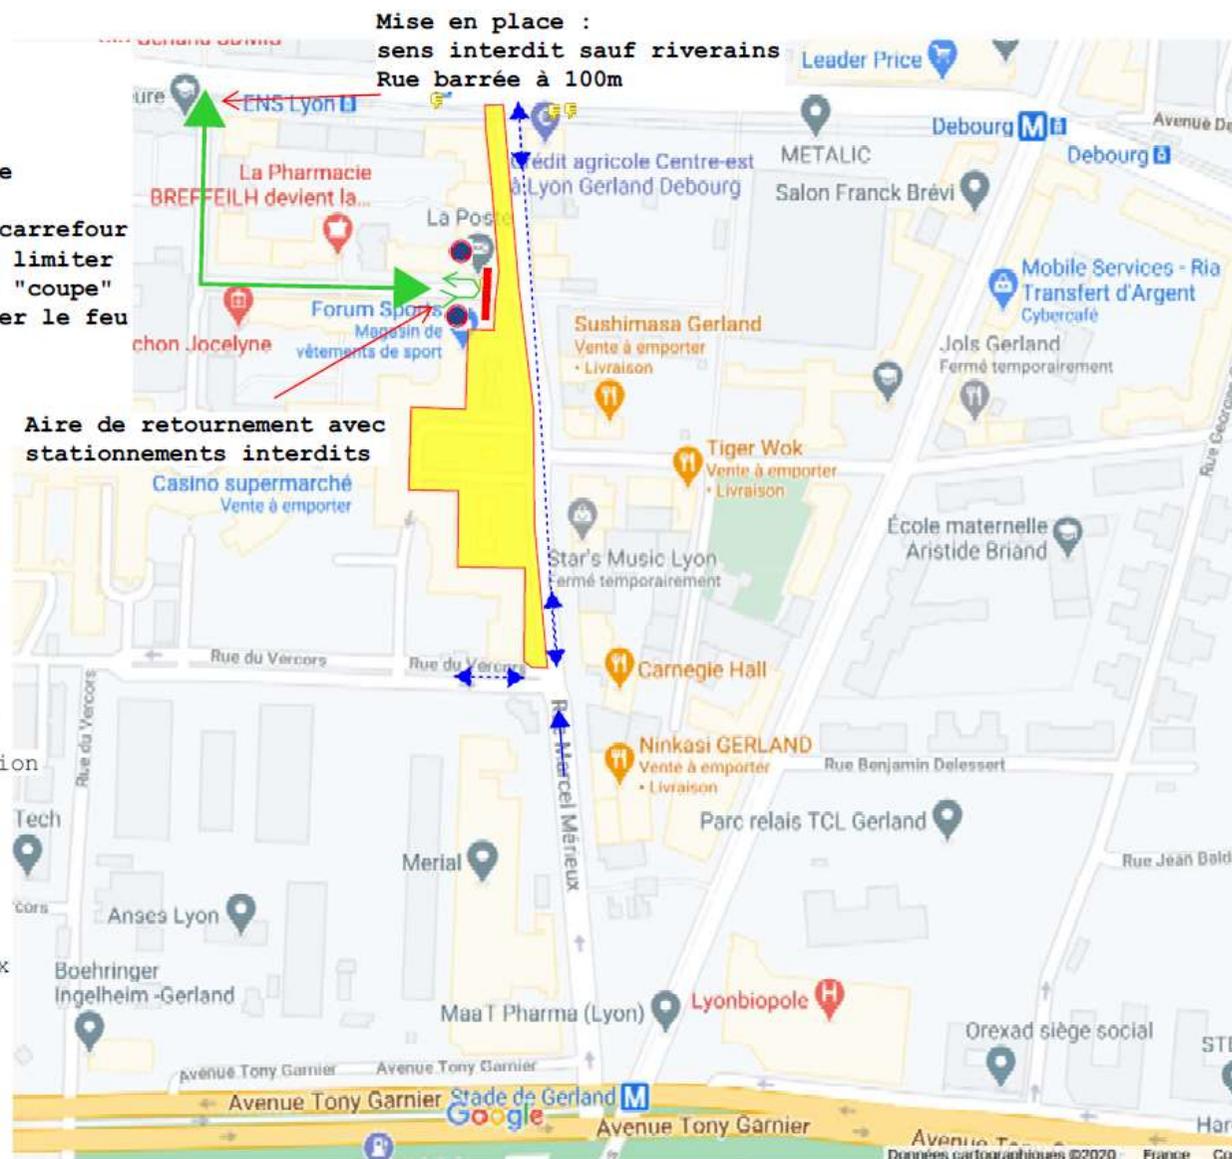

## Phase 3e du 1/11/2021 au 25/02/2022: finitions

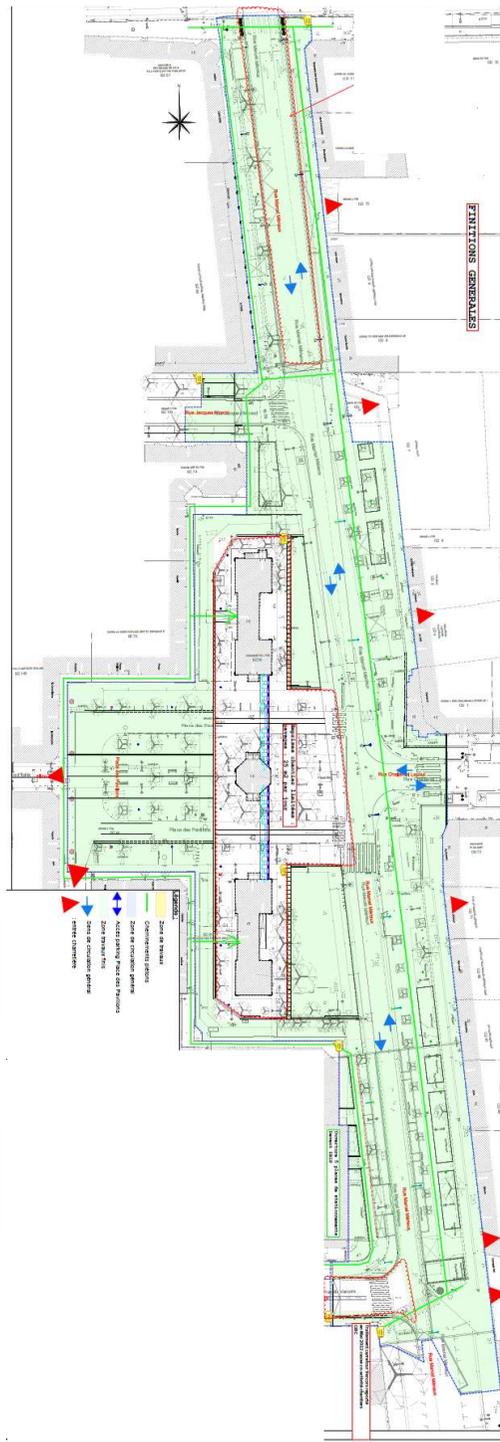


### - Travaux à réaliser :

- Place des Pavillons: pavage et fin du trottoir
- Sur l'ensemble du périmètre: finitions générales en emprises ponctuelles: réfection pieds de candélabres restants, câblage de réseaux, espaces verts

# Sujets en cours d'expertise

## Réalisation de la couche de roulement (enrobé) sur la rue Mérieux entre Monod et Debourg

### Traitement du carrefour Vercors/Mérieux

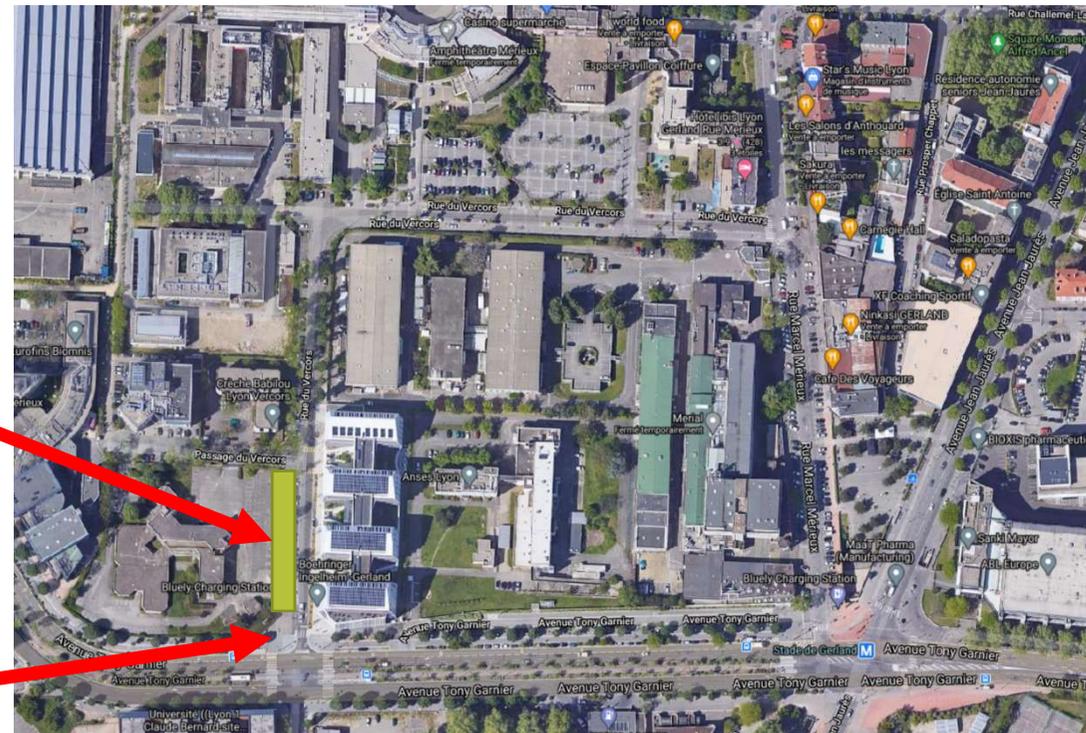

## Rappel : les modalités d'échange et les horaires de chantier

---

**Le contact à privilégier pour toutes questions relatives au projet est la Métropole de Lyon via l'adresse mail [pavillons@grandlyon.com](mailto:pavillons@grandlyon.com) Vos questions seront examinées chaque semaine lors de la réunion de chantier hebdomadaire pour vous apporter réponse**

### 2 contacts spécifiques:

- La Ville de Lyon, Direction de l'économie, du commerce et de l'artisanat, pour la réglementation des terrasses et l'occupation temporaire du domaine public.
- L'entreprise GUINTOLI, titulaire du marché de travaux, pour les questions spécifiques et urgentes d'accessibilité. Contact sur le chantier.


Les travaux sont réalisés du lundi au vendredi de 7h30 à 16h30. Les livraisons sont à privilégier, autant que possible, en dehors de cette plage horaire



Les travaux de sablage vont débuter semaine du 6/04. Ces travaux vont générer des nuisances (bruit, poussière). Des précautions spécifiques seront prises par l'entreprise.

## Rappel: le dispositif d'information

- 1 panneau de chantier (Debourg/Fontenay), 2 panneaux projet (Debourg/Mérieux et Vercors/Mérieux), 1 totems (rue Challemel avant le carrefour avec Mérieux)
- 1 plaquette projet distribuée début janvier, 2 flyers distribués en février et mars.
- 1 lieu de ressources : le site internet de la mission Gerland :  
<https://www.lyon-gerland.com/>  
<https://www.facebook.com/ProjetGerland>
- La plaquette projet est accessible via <https://www.lyon-gerland.com/le-projet-urbain/ilot-pavillons-fontenay/>
- Le phasage des travaux est accessible via <https://www.lyon-gerland.com/category/actualites/>

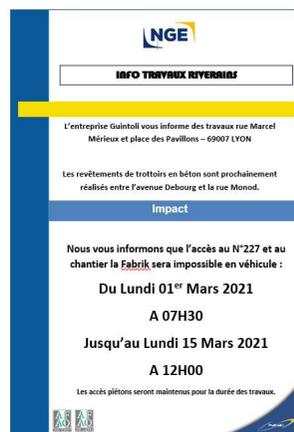



Exemples communication



Barrière chantier et dispositif accessibilité

---

# Echanges



# Le plan des aménagements

