











Lyon 7

Requalification de la Place des Pavillons et de la rue Marcel Mérieux

Actualisation du phasage prévisionnel des travaux (hors intempéries) / juillet 2021

Légende:

-  Zone de travaux
-  Cheminements piétons
-  Zone de circulation général
-  Accès parking Place des Pavillons
-  Zone travaux finis
-  Sens de circulation général
-  : entrée charretière

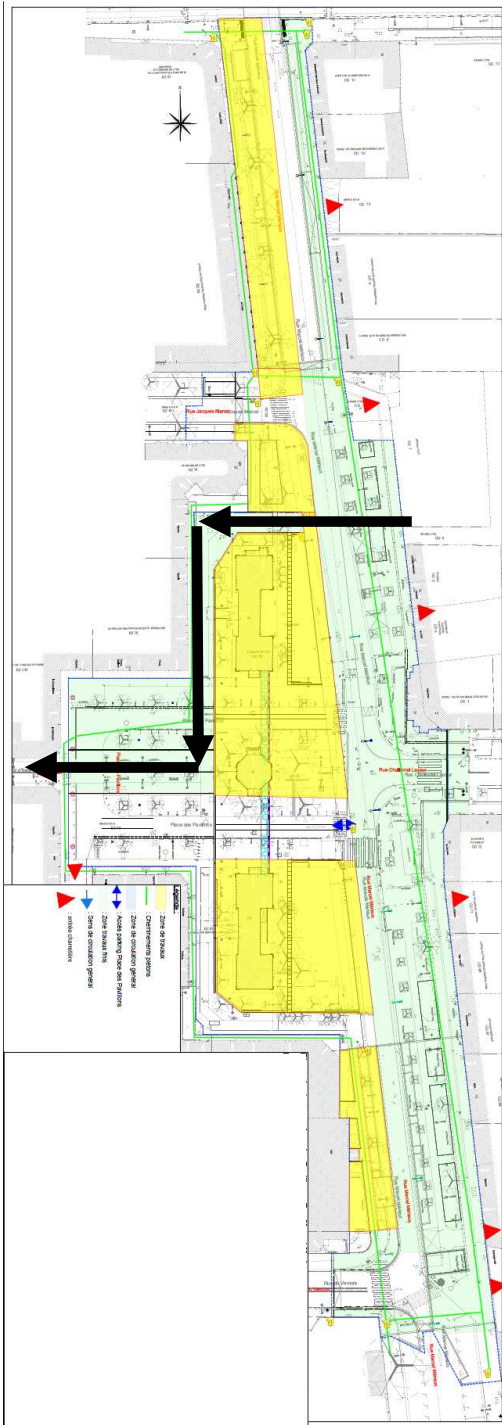


Jusqu'au 8 juillet

- Travaux à réaliser :
 - Réalisation des trottoirs et stationnements entre Monod et Debourg
 - Réalisation des trottoirs et stationnements devant hôtel Ibis jusqu'à l'épicerie Demain
 - Pavillons nord : préparation pour pavage

Du 9 au 30 juillet

- Travaux à réaliser :
 - Fermeture carrefour Mérieux/Vercors 19 et 20 juillet (+ si nécessaire 21/07)
 - Réalisation de la couche de roulement rue Mérieux entre Monod et Debourg: nuit du 21 au 22/07 de 0h à 5h (+ si nécessaire nuit du 22 au 23 juillet)
 - Fermeture carrefour Mérieux/Monod du 22/07 au 21/08
 - Pavage autour du Pavillon nord
 - Démolition de chaussée sur la partie Sud de la Place des Pavillons, réseaux et mise à la côte
 - Sablage du trottoir nord (entre Monod et Debourg) et Sud (entre Vercors et l'épicerie Demain) et devant le CIC
 - Circulation possible (livraisons/riverains) sur la future aire piétonne de la Place des Pavillons depuis la rue Mérieux par un balisage: entrée au nord du Pavillon Nord et sortie par l'allée d'Italie/Place de l'école/rue de Saint Cloud


Du 2 août à fin octobre

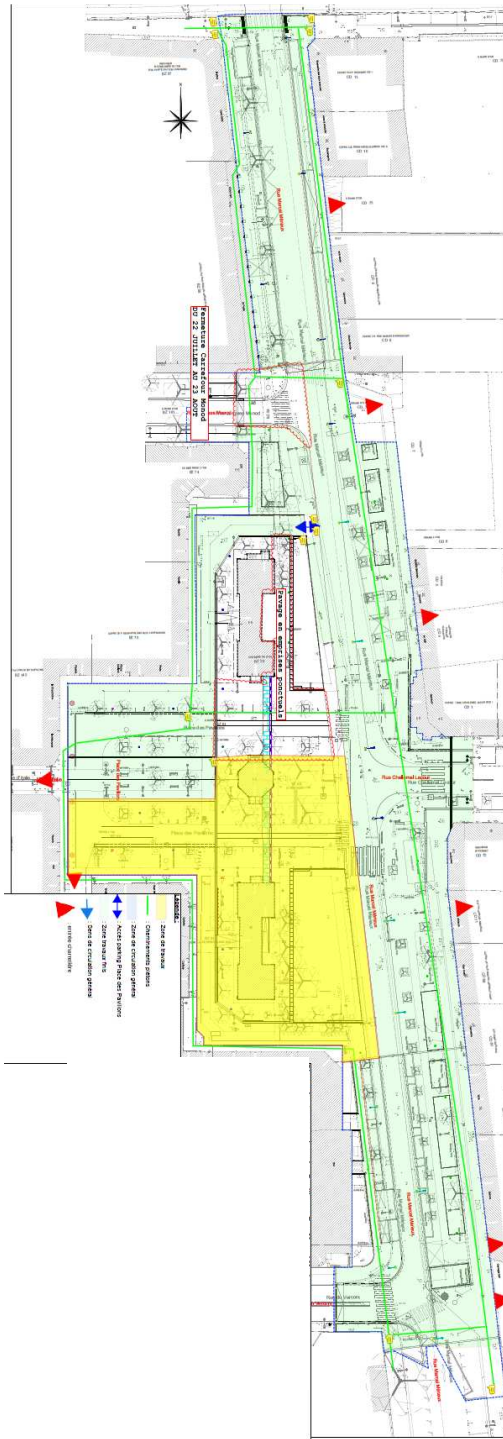

Travaux à réaliser :

- Livraison du trottoir nord (entre Monod et Debourg) et Sud (entre Vercors et l'épicerie Demain) et de l'espace devant le CIC
- Fermeture carrefour Mérieux/Monod du 22/07 au 21/08
- Pavage autour du Pavillon central et sud
- Place des Pavillons Sud: réalisation des réseaux, mise à la côte et revêtement en béton sablé,
- Sur l'ensemble du périmètre: finitions générales en emprises ponctuelles

Novembre

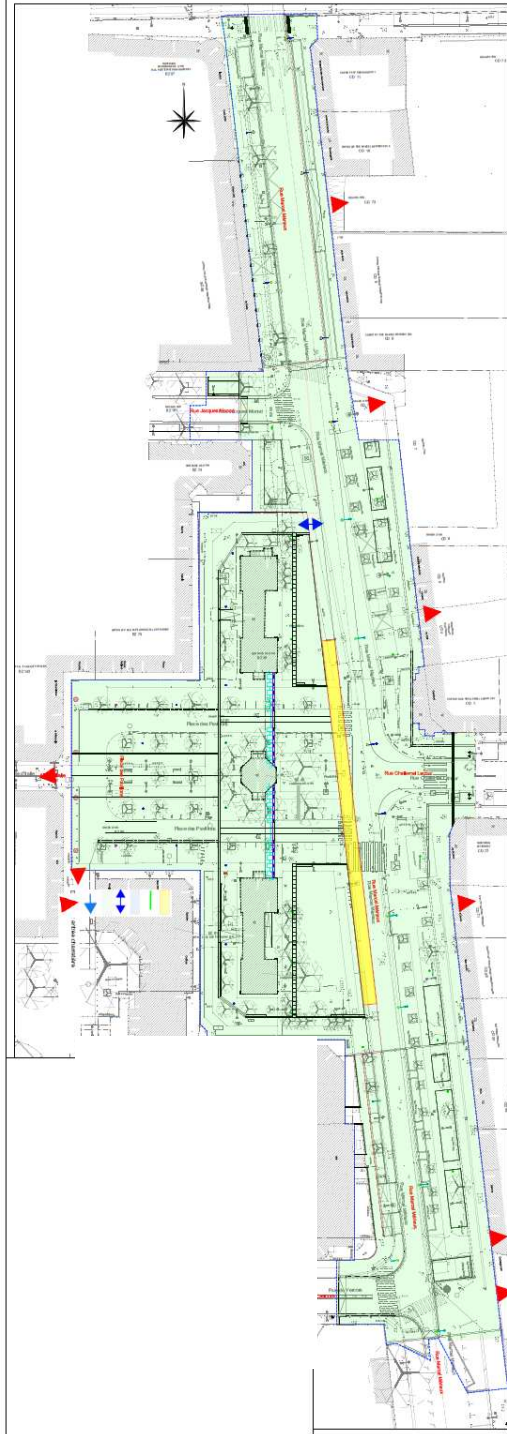


Travaux à réaliser :

- Réalisation du trottoir ouest rue Mérieux devant les Pavillons (béton sablé)
- Plantations
- Sur l'ensemble du périmètre: finitions générales en emprises ponctuelles

Décembre

Travaux à réaliser

- Sur l'ensemble du périmètre: finitions générales en emprises ponctuelles

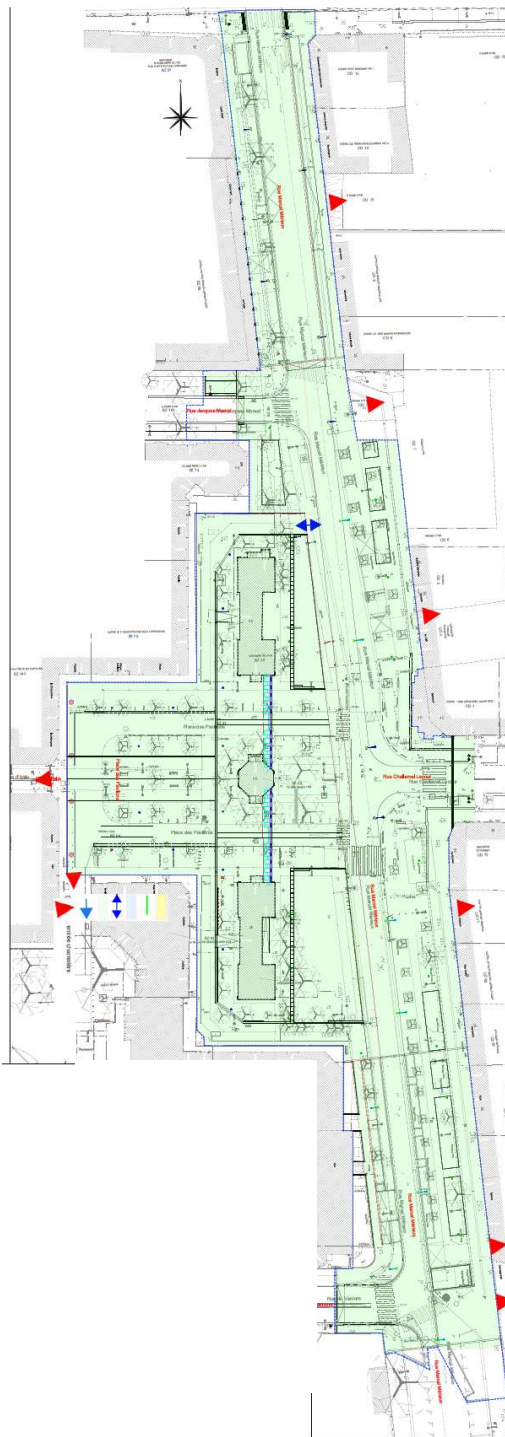

Rappel : les modalités d'échange et les horaires de chantier

Le contact à privilégier pour toutes questions relatives au projet est la Métropole de Lyon via l'adresse mail pavillons@grandlyon.com Vos questions seront examinées chaque semaine lors de la réunion de chantier hebdomadaire pour vous apporter réponse

2 contacts spécifiques:

- La Ville de Lyon, Direction de l'économie, du commerce et de l'artisanat, pour la réglementation des terrasses et l'occupation temporaire du domaine public.
- L'entreprise GUINTOLI, titulaire du marché de travaux, pour les questions spécifiques et urgentes d'accessibilité. Contact sur le chantier.


Les travaux sont réalisés du lundi au vendredi de 7h30 à 16h30. Les livraisons sont à privilégier, autant que possible, en dehors de cette plage horaire



Les travaux de sablage génèrent des nuisances (bruit, poussière). Ils sont réalisés par phase pour permettre une réalisation la plus rapide possible et ainsi limiter la gêne.

Rappel: le dispositif d'information

- 1 panneau de chantier (Debourg/Fontenay), 2 panneaux projet (Debourg/Mérieux et Vercors/Mérieux), 1 totems (rue Challemel avant le carrefour avec Mérieux)
- 1 plaquette projet distribuée début janvier, 3 flyers distribués en février, mars et juillet.
- 1 lieu de ressources : le site internet de la mission Gerland :
<https://www.lyon-gerland.com/>
<https://www.facebook.com/ProjetGerland>
- La plaquette projet est accessible via <https://www.lyon-gerland.com/le-projet-urbain/ilot-pavillons-fontenay/>
- Le phasage des travaux est accessible via <https://www.lyon-gerland.com/category/actualites/>

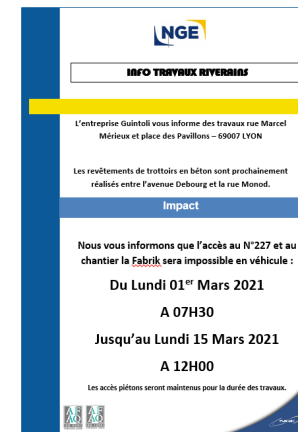

Exemples communication



Barrière chantier et dispositif accessibilité

